

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y FOMENTO
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA VICEÑO
DOMICILIO: CAL 604 No. 300 y Av. 413 Centro San Juan de Aragón
COMPLETO: Cmg. Gustavo A. Weber

FECHA DE INICIO: 28 11 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 01 2018

FECHA DEL REPORTE: 07 01 2018

SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO VÍO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECIBOSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECIBOSO EJECUCION		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES VÍO COMENTARIOS ADICIONALES
		FÍSICA	ESPECIAL	TOTAL		%	\$				
PROYECTO 2016	Unidad Académica Departamento Vno II	36,594,542.00	0.00	36,594,542.00	100%	\$17,260,827.75	100%	70%	60%	LENTAMIENTO DE ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE Muros PLANTA BAJA	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ABERRO GONZALEZ ROSA
 NOMBRE: ABERRO GONZALEZ ROSA
 CASO: 001 DEL CENTRO DE PUBLICACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 CORREO ELECTRONICO: BERROGALIC@UNIGUATEMALA.EDU.GU
 TEL. 01 502 701 2000

YO SO, DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE: [Firma]
 DE: [Firma]
 FIRMA

SELO OFICIAL

ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACION PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSERVE PRODUCTOS FINANCIEROS, Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA YA PROYECTO CONCLUIDO

PAIS (CÓDIGO DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 A 2017)
 PAIS (CÓDIGO PARA LA MANIPULACION DE LA OBRA EDUCATIVA)
 PROYECTO/PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)

DIRECCIÓN DE CONTINER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAIS PROYECTO DE APORTE A LA CALIDAD
 PBR (PROGRAMA EDUCATIVO BAJA)

ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DESARROLLAR
 DIRECCION


DIRECCIÓN DE CONTINER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 REPORTE DE AVANCE DE OBRA VÍO MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

DESARROLLO DE ESTRUCTURA DEL SERVIDOR Y CONFIGURACIÓN DE TIPOS Y ESTRUCTURA PARA PBR

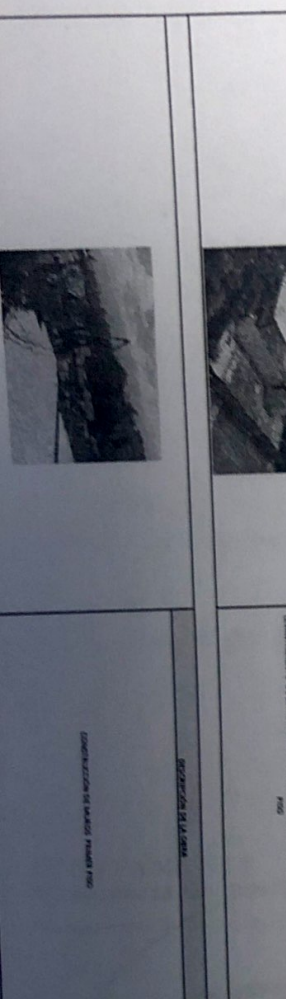

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE MUROS PLANTA PBR
